

퀀터플 역세권, 왕십리광장 기능 강화

공약출처	사업유형		사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	✓		✓		
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 642백만 원 (시 250, 구 392)	
✓					

정책목표

- 퀀터플 역세권 왕십리 광장 활성화를 통해 왕십리광장 기능 강화 도모

사업개요

- 임기내 추진목표: 왕십리광장 경관 개선으로 기능 강화
- 사업기간: 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사업내용
 - 예술성을 가미한 빛 벤치 및 모듈형(이동형) 벤치 설치
 - 왕십리역 4번 출구 앞 스마트쉼터 조성
 - 아트월 벽화 조성 및 벽화 하부 LED 매립바 설치
 - 왕십리광장 녹지 정비(교육특구 조형물 이설 포함) 등
- 소요예산: 642백만 원(시비 250, 구비 392)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
왕십리광장 기능 강화	-	LED 조명 설치 경관 개선 설계	경관 개선 공사	행사 추진		

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	642	1,042			162	392	480	250		400	-	-		
국비	-	320								320	-	-		
시비	370	330			140	-	230	250		80	-	-		
구비	272	392			22	392	250	-	-	-	-	-		

연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	642		143	499	-		
시비	250		-	250	-		
구비	392		143	249	-		

추진실적

- 2019. 1. ~ 2. LED 조명 설계 및 공사
- 2020. 6. 3. 쿼터플 역세권 왕십리광장 기본계획 용역 완료
- 2020. 8. 11. 경관사업 자문회의 3차 자문 완료
- 2020. 8. 31. 쿼터플 역세권 왕십리광장 실시설계 용역 완료
- 2020. 9. 16. 공사 발주(전기, 조경)
- 2020. 9. 16. 스마트쉘터 설치 검토 요청(서울교통공사)
- 2020. 11. 9. 공사발주(스마트쉘터)
- 2020. 11. 30. 조경공사 준공
- 2020. 12. 23. 전기공사 준공
- 2020. 12. 24. 스마트 쉘터 조성 등 경관개선 사업 완료


향후계획

- 2021. ~ 빛 벤치, 조명 등 시설물 유지 관리를 통해 쾌적한 환경 조성

총괄부서

문화체육과장: 문광선 ☎5191 관광팀장: 조동익 ☎5192 담당: 이한나 ☎5193

위 치 도

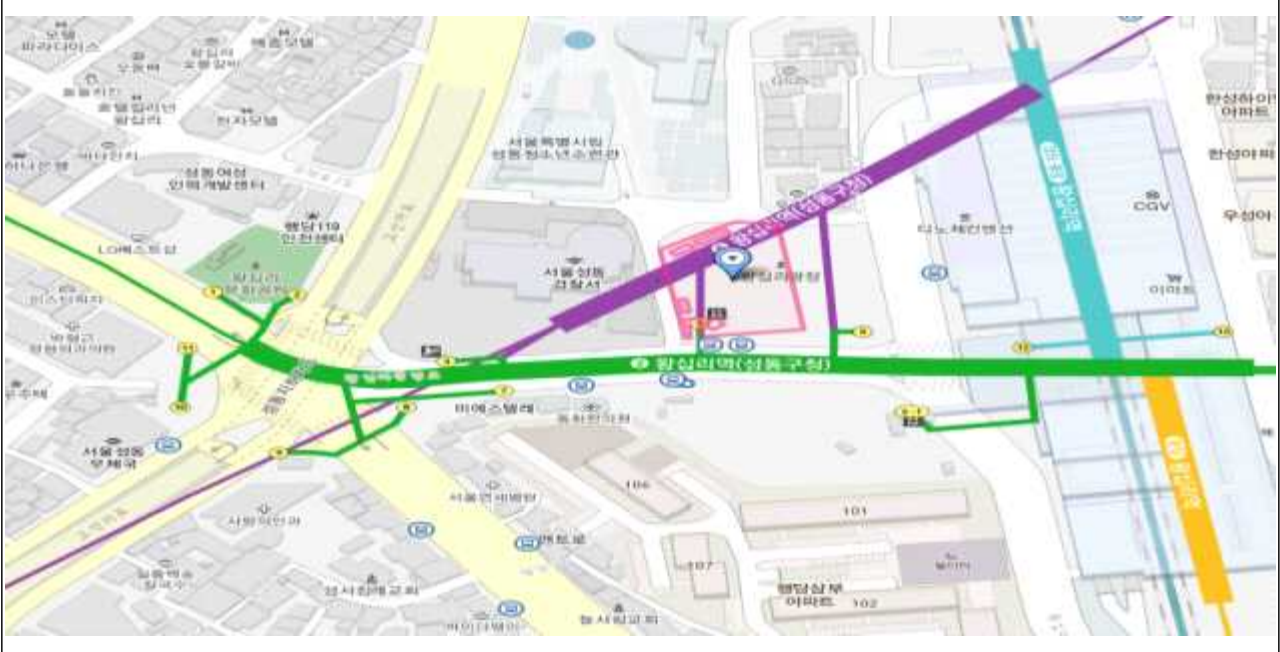

현 장 사 진



주간전경



야간전경



빛 벤치(겨울)



빛벤치(여름)
